LOT별 작업조건확인 결과보고서: TK260725-420

LOT 정보

LOT 번호	TK260725-420	작업시작	2026-07-25 08:50:00.0	작업종료	2026-07-25 15:25:00.0
업체명	(주)동양	품명	DN8 OUTER BOSS (일원	품번	AOB0005-R3-30
재질	SCR420 HB/ 25MnCrS6-1	규격	Φ160 X L30.9	설비명	열처리:침탄로 4호기

열처리 시작	2026-07-25 08:50:00.0	열처리 종료	2026-07-25 15:25:00.0
템퍼링 시작		템퍼링 종료	

LOT 설정값

공정명	예열	침탄	확산	강온	균열	냉각
처리온도(℃)	15-20					
처리시간(분)	900±5	90±10	1.1±0.05	35±10	0.8±0.05	840±5
처리 C.P(%)	40±10	0.8±0.05	130±10	50 hz		20±10

존 투입 시간

위치	예열	침탄	확산	강온	균열	냉각
투입시간	20±10	90±10	35±10	40±10		

템퍼링 온도 15-20℃ / 시간 -분


측정데이터

	퀜칭					템퍼링				
경도	X1	X2	X3	X4	X5	X1	X2	X3	X4	X5
표면	83.7	83.7	83.6							
판정	대기					대기				
규격	HRA 80~					HV 450~500				

LOT 진행 중 알람LIST

해당 작업기간 중 발생한 알람이 없습니다.

온도 트렌드 – 열처리

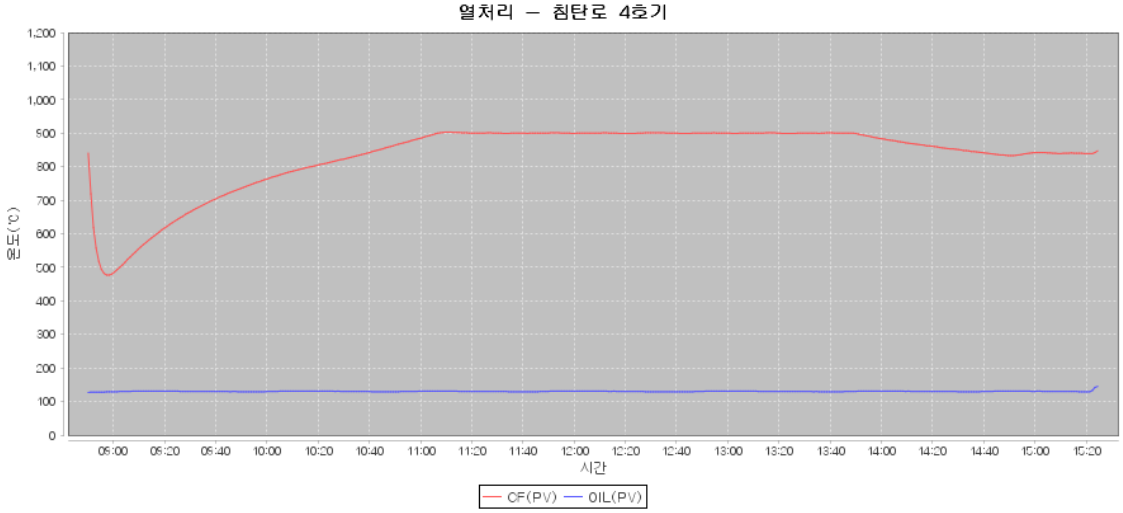

온도 트렌드 – 템퍼링
