LOT별 작업조건확인 결과보고서: TK260727-310

LOT 정보					
LOT 번호	TK260727-310	작업시작	2026-07-27 09:40:00.0	작업종료	2026-07-27 20:40:00.0
업체명	(주)동양	품명	DN8 OUTER BOSS (일원	품번	AOB0005-R3-30
재질	SCR420 HB/ 25MnCrS6-1	규격	Φ160 X L30.9	설비명	열처리:침탄로 3호기 / 템퍼링 :템퍼링기 1호기

LOT 설정값						
공정명	예열	침탄	확산	강온	균열	냉각
처리온도(℃)	160±10	120±30분				
처리시간(분)	900±5	90±10	1.1±0.05	35±10	0.8±0.05	840±5
처리 C.P(%)	40±10	0.8±0.05	130	50 hz		20±10

존 투입 시간						
위치	예열	침탄	확산	강온	균열	냉각
투입시간	20±10	90±10	템퍼링 온도 160±10℃	/ 시간 120±30분		


측정데이터										
	퀜칭					템퍼링				
경도	X1	X2	X3	X4	X5	X1	X2	X3	X4	X5
표면	83.7	83.6	83.7							
판정	합격					합격				
규격	HRA 80~					HV 450~500				

LOT 진행 중 알람LIST

[열처리(침탄로 3호기)]
07-27 12:09 CP 이상 (발생)
07-27 12:19 RX GAS 유량 하한 (해제)
07-27 14:14 본체 온도 이상 (발생)

[템퍼링(템퍼링기 1호기)]
07-27 19:17 종합 이상 (발생)
07-27 19:17 종합 이상 (해제)
07-27 19:37 종합 이상 (발생)
07-27 19:37 종합 이상 (해제)
07-27 20:38 종합 이상 (발생)
07-27 20:38 종합 이상 (해제)

온도 트렌드 – 열처리

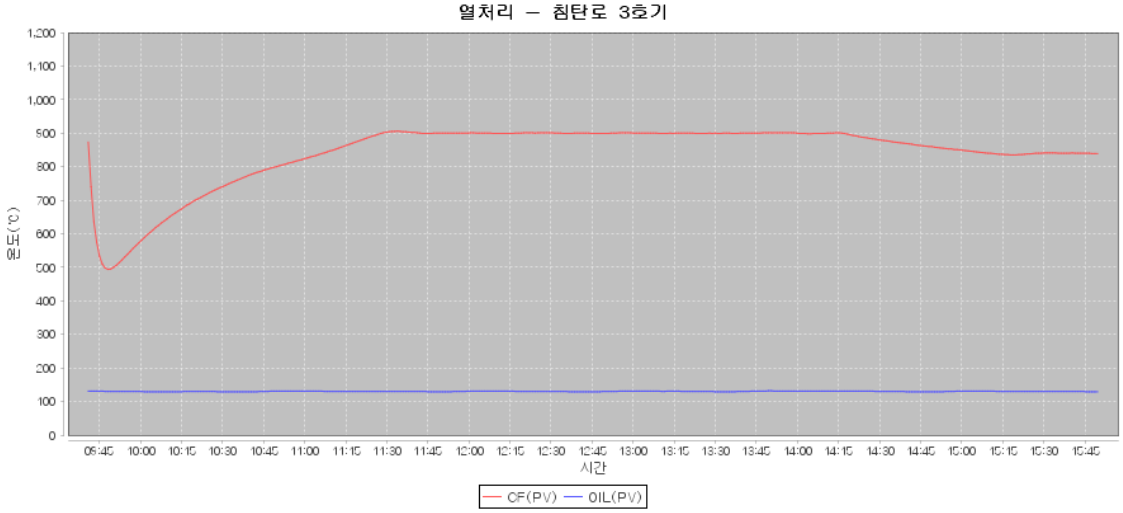

온도 트렌드 – 템퍼링

