LOT별 작업조건확인 결과보고서: TK260730-140

LOT 정보

LOT 번호	TK260730-140	작업시작	2026-07-30 22:20:00.0	작업종료	2026-07-31 04:50:00.0
업체명	상진정밀주식회사	품명	SHAFT-ROTOR [식별홈]	품번	M36516-2BDH0
재질	SCR420HB	규격	Φ71XL136.5	설비명	열처리:침탄로 1호기

열처리 시작	2026-07-30 22:20:00.0	열처리 종료	2026-07-31 04:50:00.0
템퍼링 시작		템퍼링 종료	

LOT 설정값

공정명	예열	침탄	확산	강온	균열	냉각
처리온도(℃)						
처리시간(분)	910	140	1.1	60	0.8	840
처리 C.P(%)	20	0.8	130	50		20

존 투입 시간

위치	예열	침탄	확산	강온	균열	냉각
투입시간	20	140	60	20		


측정데이터

	퀜칭					템퍼링				
경도	X1	X2	X3	X4	X5	X1	X2	X3	X4	X5
표면	83.5	83.7	83.4							
판정	대기					대기				
규격	HRA 80~					~				

LOT 진행 중 알람LIST

[열처리(침탄로 1호기)]
07-30 22:58 유조 아지테이터 INV TRIP (해제)
07-31 04:49 RX GAS 유량 하한 (발생)
07-31 04:49 유조 액면 LEVEL LOW (발생)

온도 트렌드 – 열처리

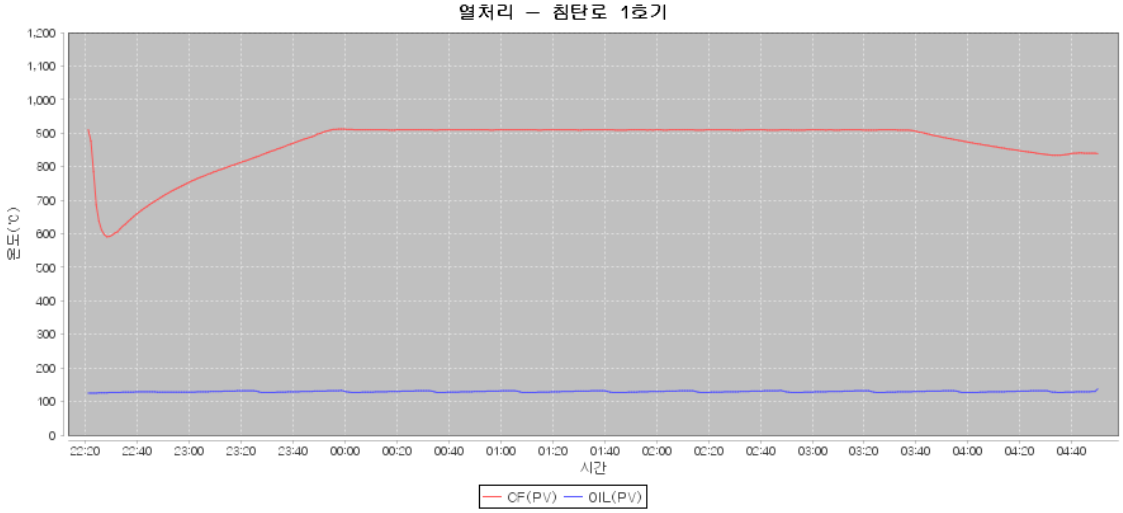

온도 트렌드 – 템퍼링
