LOT별 작업조건확인 결과보고서: TK260731-52A

LOT 정보

LOT 번호	TK260731-52A	작업시작	2026-07-31 08:40:00.0	작업종료	2026-07-31 14:45:00.0
업체명	(주)동양	품명	GEN2 PARKING-GEAR 대	품번	APG0009-R0-30
재질	SCR420HB	규격	Φ132 X L39	설비명	열처리:침탄로 5호기

열처리 시작	2026-07-31 08:40:00.0	열처리 종료	2026-07-31 14:45:00.0
템퍼링 시작		템퍼링 종료	

LOT 설정값

공정명	예열	침탄	확산	강온	균열	냉각
처리온도(℃)	16					
처리시간(분)	900	90	1.10	50	0.80	840
처리 C.P(%)	30	0.80	140	50		20

존 투입 시간

위치	예열	침탄	확산	강온	균열	냉각
투입시간	20	90	50	30		

템퍼링 온도 16℃ / 시간 -분


측정데이터

	퀜칭					템퍼링				
경도	X1	X2	X3	X4	X5	X1	X2	X3	X4	X5
표면	83.7	83.6	83.7							
판정	대기					대기				
규격	HRA 80~					~				

LOT 진행 중 알람LIST

해당 작업기간 중 발생한 알람이 없습니다.

온도 트렌드 – 열처리

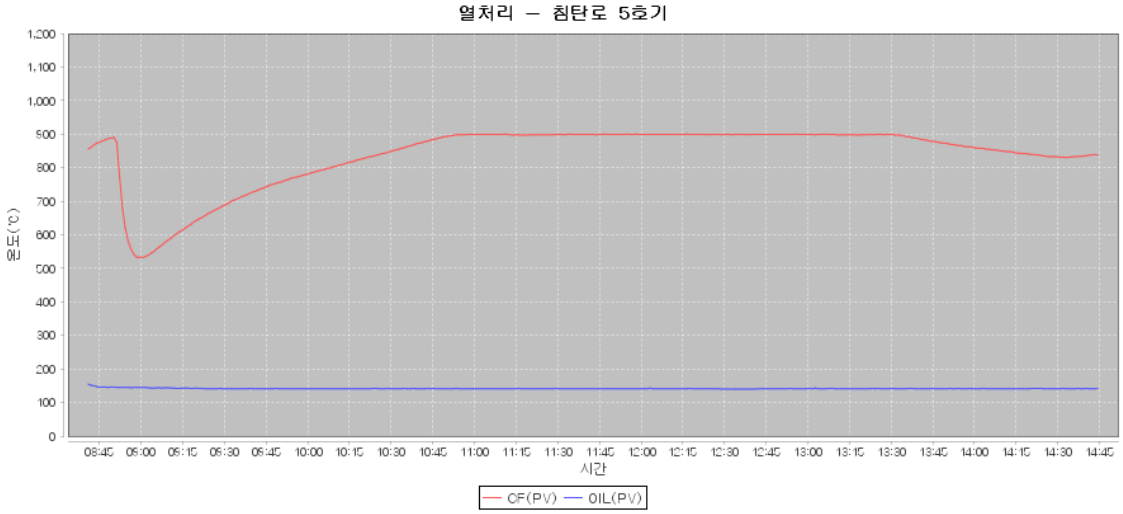

온도 트렌드 – 템퍼링
