LOT별 작업조건확인 결과보고서: TK261007-220

LOT 정보

LOT 번호	TK261007-220	작업시작	2026-10-07 13:20:00.0	작업종료	2026-10-07 16:20:00.0
업체명	삼성분말야금(주)	품명	ROTOR-A/TRNS FLUID	품번	OP6-13E001
재질	소결합금	규격		설비명	열처리:침탄로 2호기

열처리 시작	2026-10-07 13:20:00.0	열처리 종료	2026-10-07 16:20:00.0
템퍼링 시작		템퍼링 종료	

LOT 설정값

공정명	예열	침탄	확산	강온	균열	냉각
처리온도(℃)	15~20m3/h					
처리시간(분)	850±10℃	80±10분	0.8±0.05			850±10℃
처리 C.P(%)	1±5분	0.8±0.05	120±10℃	50±10Hz		20±10분

존 투입 시간

위치	예열	침탄	확산	강온	균열	냉각
투입시간	20±10분	80±10분		1±5분		

템퍼링 온도 15~20m3/h℃ / 시간 -분


측정데이터

	퀜칭					템퍼링				
경도	X1	X2	X3	X4	X5	X1	X2	X3	X4	X5
표면	46.5	46.6	46.6							
판정	대기					대기				
규격	HRC 30~45					~				

LOT 진행 중 알람LIST

해당 작업기간 중 발생한 알람이 없습니다.

온도 트렌드 – 열처리

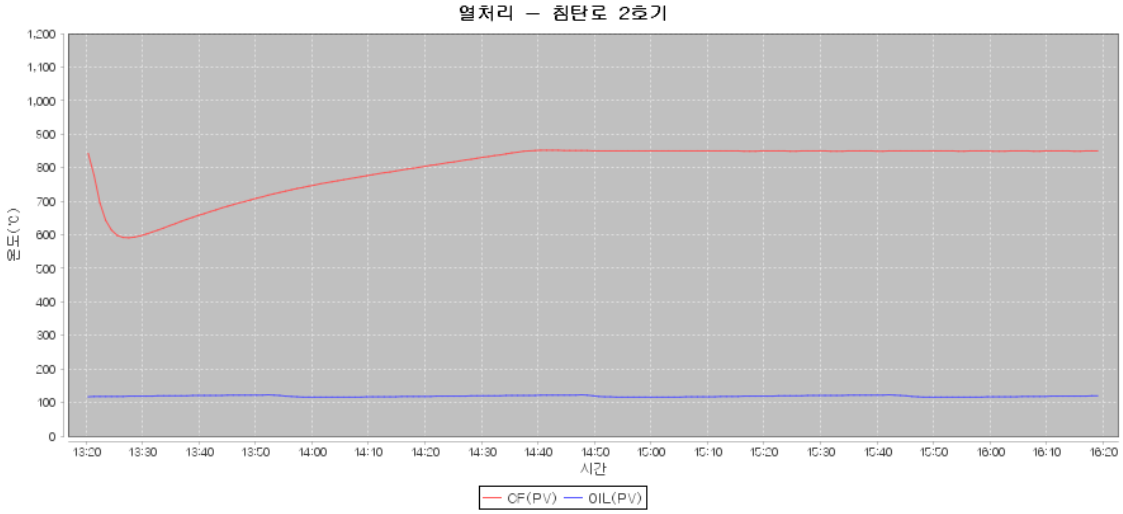

온도 트렌드 – 템퍼링
