
열처리 침탄(CASE) CHECK SHEET

결 재	작성	확인	승인

생산LOT TK251120-11A 설비명 침탄로 1호기

수주NO	거래처	품명	품번	재질	수량	중량
	표면경도	경화깊이	화합물층	공정		
251120001	(주)동양	GEN2 PARKING-GEAR 대형	APG0009-R0-30	SCR420HB	100	0.0
	HRA80 이상	HRA80 이상		침탄		
251120002	(주)동양	GEN2 PARKING-GEAR 초대형	APG0010-R0-30	SCR420HB	100	0.0
	HRA80 이상	HRA80 이상		침탄		
전체합계					200	0.0

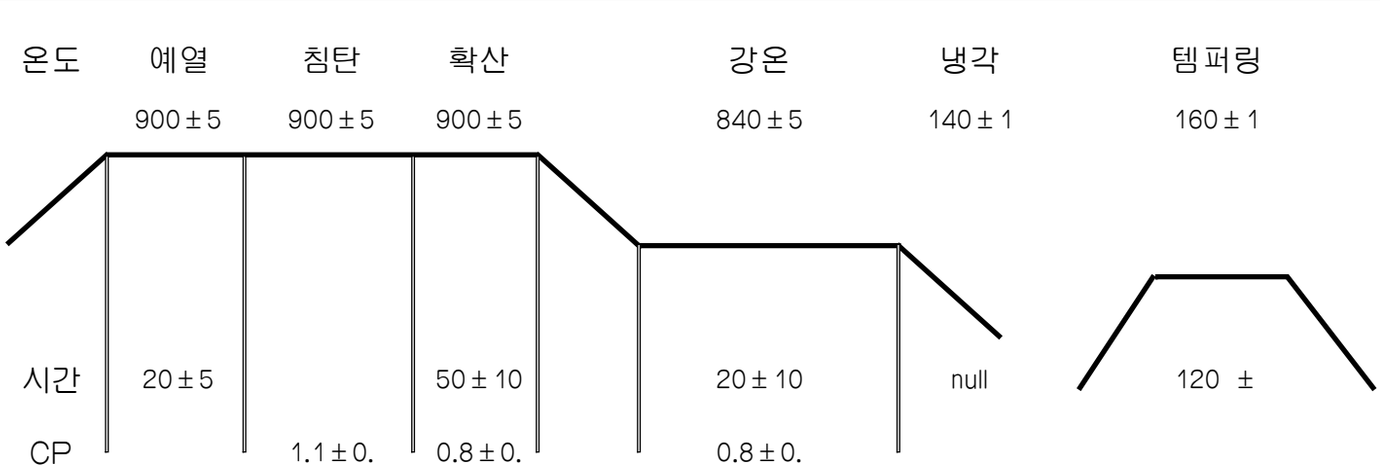

작업자 admin 시작일시 2025-11-20 09:12:26

바스켓 (파손,변형없을것)	X	부품혼입	X	레일 (변형, 파손)	X	체인 (겹침, 파손)	X	L/S (이탈,파손)	X

작업시 확인사항(측정값 기록시 소숫점 전체로 기재 할것)

NO	점검항목 1 STEP 기준	예열	침탄	확산	강온	점검항목 템퍼링	온도	시간
1	시간					표준		
2	지시온도					작성		
3	CP값					교반속도(hz)		
4	유지시간					이종품혼입유무		
5	RX 유량은? (15~20 m3/h)							

특기사항	1. 매 CHARGE STEP 간격으로 기입할 것. 2. 이상발생시 지침서에 준할 것. 3. 작업 표준서 준수해서 작업 할 것.	전달사항	
