열처리 침탄(CASE) CHECK SHEET


J000101734

결재	작성	확인	승인

생산LOT	TK260904-520	침탄 설비명	침탄로 5호기	템퍼링 설비명	

수주NO	거래처 / 표면경도	품명 / 경화깊이	품번 / 화합물층	재질 / 공정	수량	중량
260904010	(주)동양	Y7T SLEEVE HIGH	25194365 (TC4645)	SCR420H2 VS2	1800.0	306.0
	HRA 77 ~ 83	유효경화 550 ~ HV	~	침탄		
260904010	(주)동양	Y7T SLEEVE HIGH	25194365 (TC4645)	SCR420H2 VS2	1800.0	306.0
	HRA 77 ~ 83	유효경화 550 ~ HV	~	침탄		
260904010	(주)동양	Y7T SLEEVE HIGH	25194365 (TC4645)	SCR420H2 VS2	1800.0	306.0
	HRA 77 ~ 83	유효경화 550 ~ HV	~	침탄		
260904014	(주)동양	GEN1 PARKING-GEAR 초대형	APG0008-R0-60	SCR420HB	78.0	117.0
	HRA 80 ~	유효경화 550 ~ HV	~	침탄		
260904014	(주)동양	GEN1 PARKING-GEAR 초대형	APG0008-R0-60	SCR420HB	78.0	117.0
	HRA 80 ~	유효경화 550 ~ HV	~	침탄		
260904014	(주)동양	GEN1 PARKING-GEAR 초대형	APG0008-R0-60	SCR420HB	78.0	117.0
	HRA 80 ~	유효경화 550 ~ HV	~	침탄		
전체합계					5634.0	1269.0

온도	예열	침탄	확산	강온	냉각	템퍼링
	900±5	900±5	900±5	840±5	140	160
시간	20±10	90±10	50±10	20±10		120
CP		1.1±0.05	0.8±0.05			

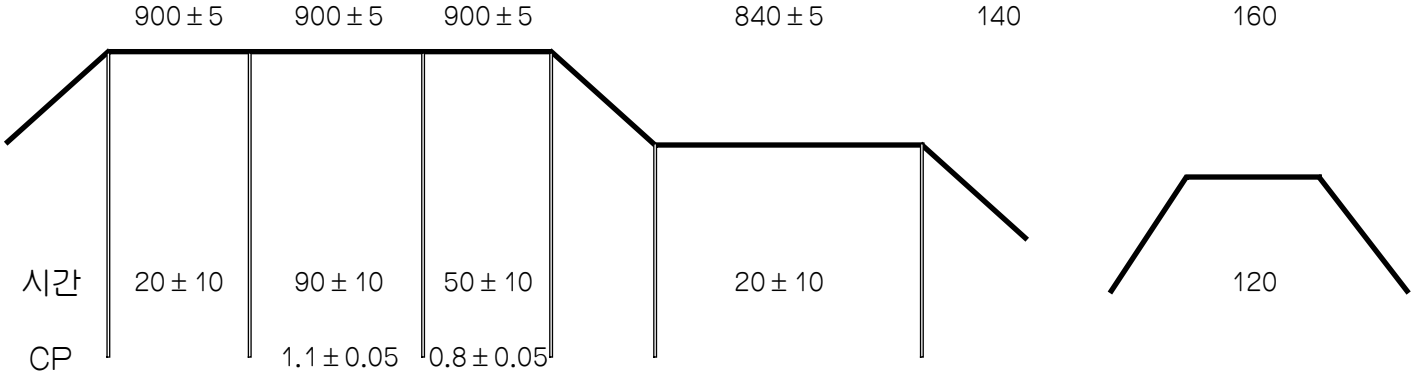

작업자	침탄 시작일시	2026-09-04 23:00	침탄 종료일시	
admin	템퍼링 시작일시		템퍼링 종료일시	

바스켓 (파손,변형없을것)	X	부품혼입	X	레일 (변형, 파손)	X	체인 (겹침, 파손)	X	L/S (이탈,파손)	X

작업시 확인사항(측정값 기록시 소숫점 전체로 기재 할것)

NO	점검항목 1 STEP 기준	예열	침탄	확산	강온	점검항목 템퍼링	온도	시간
1	시간					표준		
2	지시온도					작성		
3	CP값					교반속도(hz)		
4	유지시간					이종품혼입유무		
5	RX 유량은? (15~20							

특기사항	1. 매 CHARGE STEP 간격으로 기입할 것. 2. 이상발생시 지침서에 준할 것. 3. 작업 표준서 준수해서 작업 할 것.	전달사항	
