
열처리 침탄(CASE) CHECK SHEET

J000101769

결재	작성	확인	승인

생산LOT	TK260908-22A	침탄 설비명	침탄로 2호기	템퍼링 설비명			
수주NO	거래처	품명	품번	재질	수량	중량
	표면경도	경화깊이	화합물층	공정		
260907009	삼성분말야금(주)	CAMRING-SINTER "H"	859522 CVT19 "H"	SMF5030	2500.0	197.50002
	HV 600 ~ 800	유효경화 513 ~ HV	~	QT		
260907015	두현분말야금(주)	CLUTCH CAM (840)	HA-S111-352 (0.028)	소결품	210.0	210.0
	HRC 38 ~	유효경화 ~	~	QT		
전체합계					2710.0	407.5

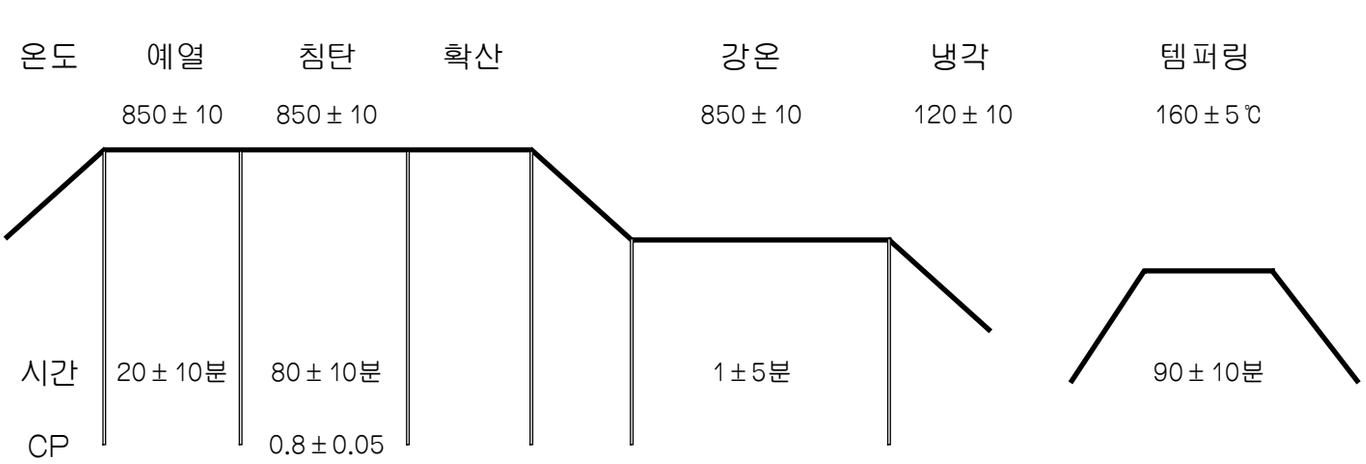

작업자		침탄 시작일시	2026-09-08 04:20	침탄 종료일시	
윤재근		템퍼링 시작일시		템퍼링 종료일시	

바스켓 (파손,변형없을것)	X	부품혼입	X	레일 (변형, 파손)	X	체인 (겹침, 파손)	X	L/S (이탈,파손)	X

작업시 확인사항(측정값 기록시 소숫점 전체로 기재 할것)

NO	점검항목 1 STEP 기준	예열	침탄	확산	강온	점검항목 템퍼링	온도	시간
1	시간					표준		
2	지시온도					작성		
3	CP값					교반속도(hz)		
4	유지시간					이종품혼입유무		
5	RX 유량은? (15~20							

특기사항	1. 매 CHARGE STEP 간격으로 기입할 것. 2. 이상발생시 지침서에 준할 것. 3. 작업 표준서 준수해서 작업 할 것.	전달사항	
