열처리 침탄(CASE) CHECK SHEET

J000101858

결	작성	확인	승인
재			

생산LOT	TK260910-510	침탄 설비명	침탄로 5호기	템퍼링 설비명	

수주NO	거래처	품명	품번	재질	수량	중량
	표면경도	경화깊이	화합물층	공정		
260910006	(주)동양	Y7T SLEEVE 5TH	25194366 (TC4646)	SCR420H2 VS2	1800.0	306.0
	HRA 77 ~ 83	유효경화 550 ~ HV	~	침탄		

전체합계		1800.0	306.0

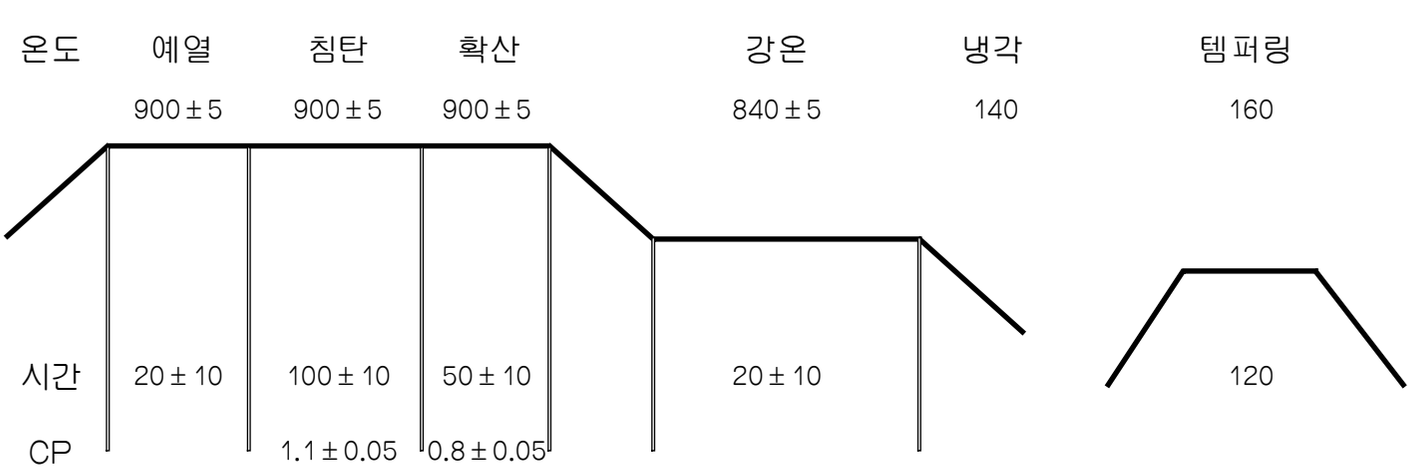

작업자	침탄 시작일시	2026-09-10 13:30	침탄 종료일시	
정희주	템퍼링 시작일시		템퍼링 종료일시	

바스켓 (파손,변형없을것)		부품혼입		레일 (변형, 파손)		체인 (겹침, 파손)		L/S (이탈,파손)	

작업시 확인사항(측정값 기록시 소숫점 전체로 기재 할것)

NO	점검항목 1 STEP 기준	예열	침탄	확산	강온	점검항목 템퍼링	온도	시간
1	시간					표준		
2	지시온도					작성		
3	CP값					교반속도(hz)		
4	유지시간					이종품혼입유무		
5	RX 유량은? (15~20							

특기사항	1. 매 CHARGE STEP 간격으로 기입할 것. 2. 이상발생시 지침서에 준할 것. 3. 작업 표준서 준수해서 작업 할 것.	전달사항	
