# 열처리 침탄(CASE) CHECK SHEET

J000102143

| 결 | 작성 | 확인 | 승인 |
|---|---|---|---|
| 재 | | | |

| 생산LOT | TK260930-110 | 침탄 설비명 | 침탄로 1호기 | 템퍼링 설비명 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 수주NO | 거래처 | 품명 | 품번 | 재질 | 수량 | 중량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 표면경도 | 경화깊이 | 화합물층 | 공정 | | |
| 260929005 | 상진정밀주식회사 | SHAFT-ROTOR [식별홈] SG2 | M36516-2BDH0 | SCR420HB | 700.0 | 454.99997 |
| | HRA 80 ~ | 유효경화 550 ~ HV | ~ | 침탄 | | |
| 전체합계 | | | | | 700.0 | 454.999 |

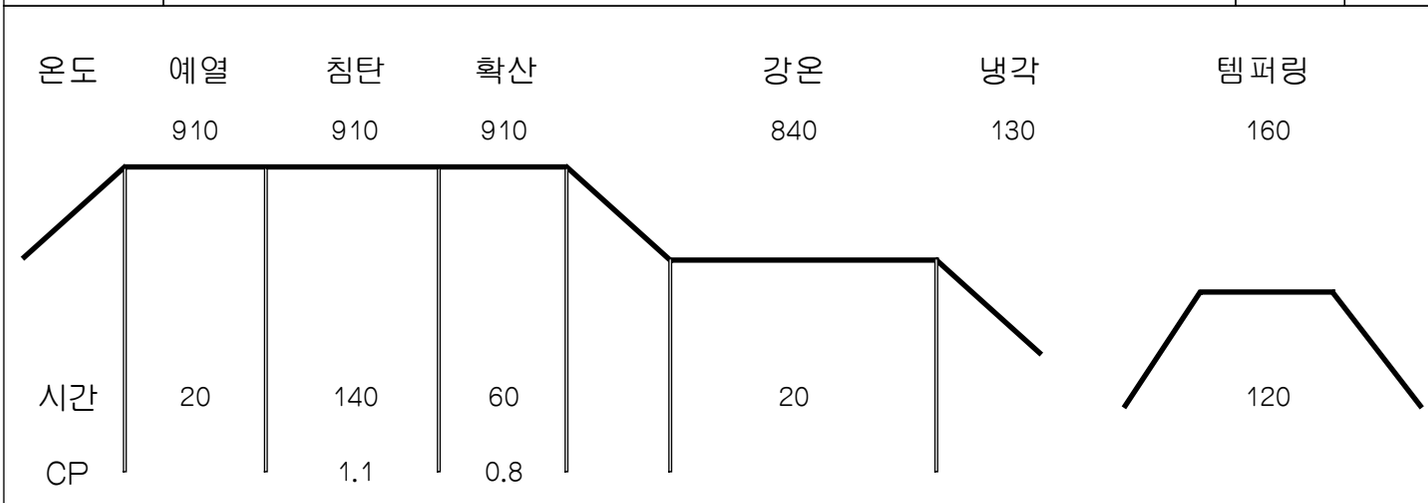


| 작업자 | 침탄 시작일시 | 2026-09-30 00:20 | 침탄 종료일시 | |
|---|---|---|---|---|
| 정희주 | 템퍼링 시작일시 | | 템퍼링 종료일시 | |

| 바스켓 (파손,변형없을것) | | 부품혼입 | | 레일 (변형, 파손) | | 체인 (겹침, 파손) | | L/S (이탈,파손) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

작업시 확인사항(측정값 기록시 소숫점 전체로 기재 할것)

| NO | 점검항목 1 STEP 기준 | 예열 | 침탄 | 확산 | 강온 | 점검항목 템퍼링 | 온도 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 시간 | | | | | 표준 | | |
| 2 | 지시온도 | | | | | 작성 | | |
| 3 | CP값 | | | | | 교반속도(hz) | | |
| 4 | 유지시간 | | | | | 이종품혼입유무 | | |
| 5 | RX 유량은? (15~20 | | | | | | | |

| 특기사항 | 1. 매 CHARGE STEP 간격으로 기입할 것.<br>2. 이상발생시 지침서에 준할 것.<br>3. 작업 표준서 준수해서 작업 할 것. | 전달사항 | |
|---|---|---|---|
