열처리 침탄(CASE) CHECK SHEET

J000102285

결	작성	확인	승인
재			

생산LOT	TK261008-220	침탄 설비명	침탄로 2호기	템퍼링 설비명	

수주NO	거래처	품명	품번	재질	수량	중량
	표면경도	경화깊이	화합물층	공정		
261007005	삼성분말야금(주)	CAMRING-SINTER "H"	859522 CVT19 "H"	SMF5030	5000.0	395.00003
	HV 600 ~ 800	유효경화 513 ~ HV	~	QT		
전체합계					5000.0	395.000

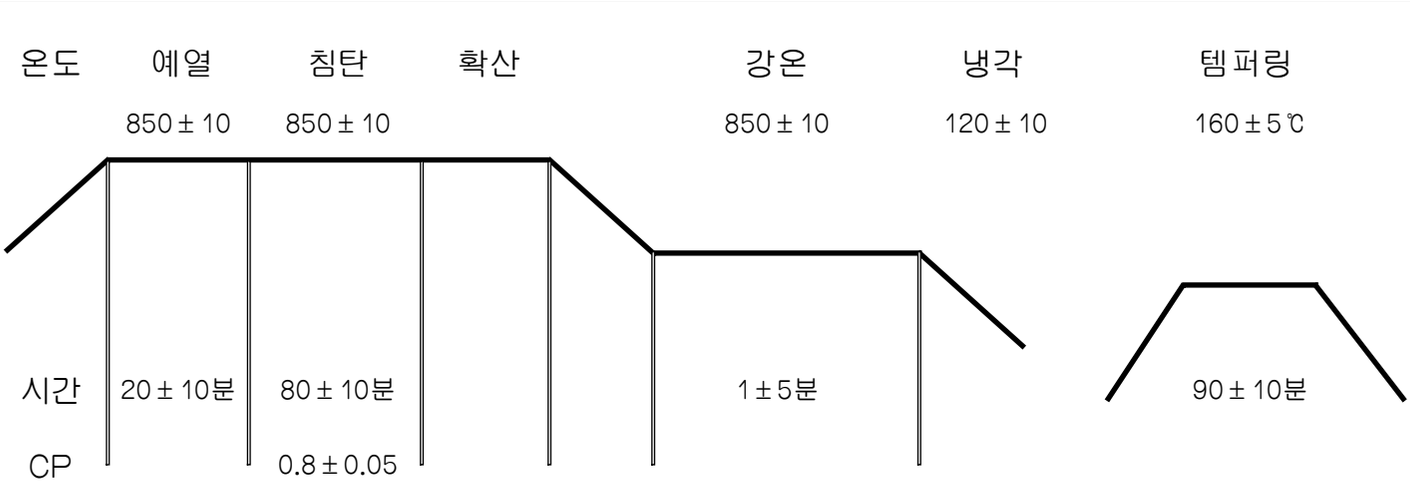

작업자	침탄 시작일시	2026-10-08 05:10	침탄 종료일시	
윤재근	템퍼링 시작일시		템퍼링 종료일시	

바스켓 (파손,변형없을것)		부품혼입		레일 (변형, 파손)		체인 (겹침, 파손)		L/S (이탈,파손)	

작업시 확인사항(측정값 기록시 소숫점 전체로 기재 할것)

NO	점검항목 1 STEP 기준	예열	침탄	확산	강온	점검항목 템퍼링	온도	시간
1	시간					표준		
2	지시온도					작성		
3	CP값					교반속도(hz)		
4	유지시간					이종품혼입유무		
5	RX 유량은? (15~20							

특기사항	1. 매 CHARGE STEP 간격으로 기입할 것. 2. 이상발생시 지침서에 준할 것. 3. 작업 표준서 준수해서 작업 할 것.	전달사항	
