LOT별 작업조건확인 결과보고서: TK260730-520

LOT 정보

LOT 번호	TK260730-520	작업시작	2026-07-30 13:40:00.0	작업종료	2026-07-30 19:30:00.0
업체명	(주)동양	품명	GEN2 PARKING-GEAR 대	품번	APG0009-R0-30
재질	SCR420HB	규격	Φ132 X L39	설비명	열처리:침탄로 5호기

열처리 시작	2026-07-30 13:40:00.0	열처리 종료	2026-07-30 19:30:00.0
템퍼링 시작		템퍼링 종료	

LOT 설정값

공정명	예열	침탄	확산	강온	균열	냉각
처리온도(℃)						
처리시간(분)	900±5	90±10	1.1±0.05	50±10	0.8±0.05	840±5
처리 C.P(%)	20±10	0.8±0.05	140±10			20±10

존 투입 시간

위치	예열	침탄	확산	강온	균열	냉각
투입시간	20±10	90±10	50±10	20±10		


측정데이터

	퀜칭					템퍼링				
경도	X1	X2	X3	X4	X5	X1	X2	X3	X4	X5
표면	83.5	83.7	83.4							
판정	대기					대기				
규격	HRA 80~					~				

LOT 진행 중 알람LIST

해당 작업기간 중 발생한 알람이 없습니다.

온도 트렌드 – 열처리

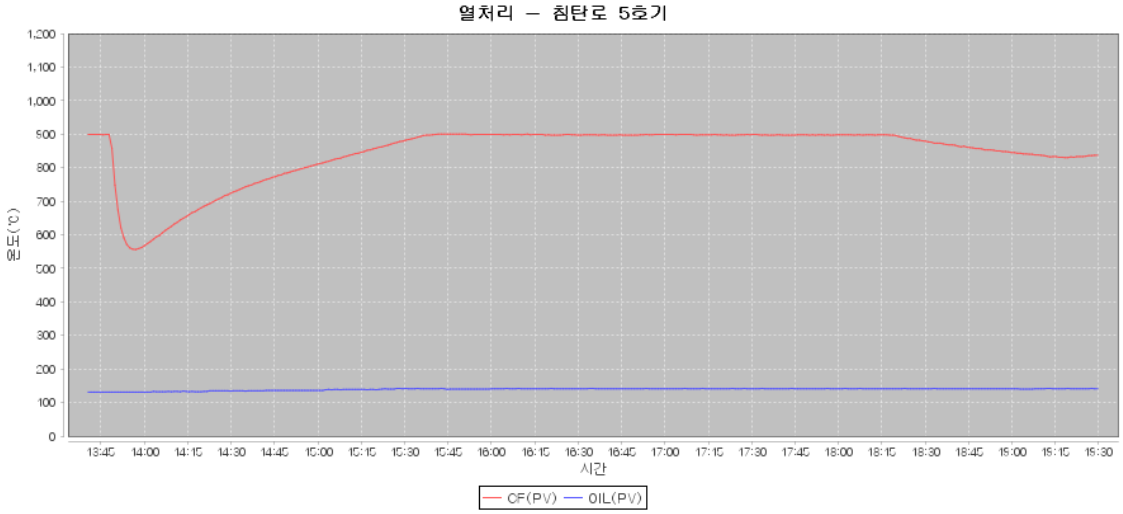

온도 트렌드 – 템퍼링
